

国道152号災害復旧だより

令和2年
9月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp
●ご不明な点がある方は、発行元へお問合せください。

この「国道152号災害復旧だより」では、天竜区龍山町内の国道152号で発生した災害の復旧状況を毎月お知らせします。



浜松市ホームページでもご覧いただけます

被災箇所位置図 至 佐久間・水窪



1 大瀬トンネル北 (龍山町瀬尻)



設置が完了したモノレール・仮設足場の様子

8月までの作業

- ・工事の支障となる立木を伐採しました。
- ・工事に必要な資機材を崩壊斜面中腹まで運搬するためにモノレール (L=310m)を設置しました。

9月の作業計画

- ・工事に必要な資機材を崩壊斜面上部まで運搬するための通路・設備を設置します。
- ・施工中の落石対策として、崩壊斜面に仮設の待受ネットを設置します。

2 秋葉トンネル北 (龍山町大嶺)



落石防護柵の施工予定箇所

8月までの作業

- ・流出した土砂の撤去が完了しました。


9月の作業計画

- ・落石防護柵の設計を行います。

4 秋葉トンネル旧道 (龍山町大嶺)

秋葉トンネルの旧道 (現在の県道大輪天竜線) は、7月7日午後から道路の沈下が確認されており、トンネルの変状との関連を調査しています。今後は、この現場の進捗もお知らせしていきます。

3 秋葉トンネル (龍山町大嶺)

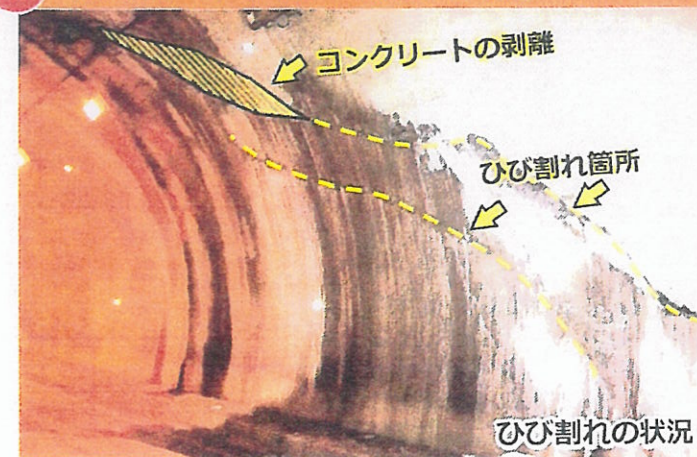

ひび割れの状況

8月までの作業

- ・7月29日に秋葉トンネル災害対策委員会を開催。
- ・トンネル内部の変状調査を行いました。
- ・周辺の山の踏査を行い、地すべり観測・調査に使用する機器の設置を開始しました。

9月の作業計画

- ・引き続きトンネル内・地すべりの観測を行います。

