

令和元年度 第7回天竜区協議会

次第

日時：令和元年 10 月 17 日（木）

午後 2 時 00 分から

会場：天竜区役所 21・22 会議室

1 開 会

2 会長あいさつ

3 区長あいさつ

4 議 事

(1) 答申事項

ア 浜松市教育文化会館の廃止について【資料 1】

イ 令和 2 年度天竜区役所費予算要求の概要について【資料 2】

(2) 協議事項

天竜 B & G 海洋センターについて【資料 3】

(3) その他事項

地域課題について

5 その他

(1) 次回開催予定

日時 令和元年 11 月 26 日（火）午後 2 時

会場 天竜区役所 21・22 会議室

6 閉 会

【資料 1】

第 1 1 号様式

諮問事項に対する答申書（案）

天竜区協議会

件 名	浜松市教育文化会館の廃止について
諮 問 内 容	廃止条例の施行をもって、浜松市教育文化会館を廃止する。
答 申	諮問内容について審議の結果、適切であると認めます。
備 考	

【資料 2】

第 1 1 号様式

諮問事項に対する答申書（案）

天竜区協議会

件 名	令和 2 年度天竜区役所費予算要求の概要について
諮 問 内 容	浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第 11 条第 2 項の 4 に基づき、令和 2 年度天竜区役所費の予算要求の概要について諮問するもの。
答 申	諮問内容について審議の結果、適切であると認めます。
備 考	

【資料 3】

第 9 号様式

区 協 議 会

区 分	<input type="checkbox"/> 諮問事項 <input checked="" type="checkbox"/> 協議事項 <input type="checkbox"/> 報告事項				
件 名	天竜 B&G 海洋センターについて				
事業の概要 (背景、経緯、 現状、課題等)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 30 年 9 月 30 日の台風 24 号により、天竜 B&G 海洋センターの屋根が被災。 ・平成 31 年 1 月以降、被災による破損箇所復旧工事、その他改修工事を実施中。 ・今年度 4 月に、施設内部に複数の腐食箇所が確認され、施設の安全性が確保されていないことが判明したことから、施設の劣化調査を実施。 				
対象の区協議会	天竜区協議会				
内 容	<p>各種調査が終了したため、台風 24 号による被災後の施設改修の進捗状況について報告、協議するもの。</p> <p>進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風 24 号による屋根の破損(被災箇所)は復旧。 ・現在は、施設内部の梁や柱の補強工事を進めている。 ・調査の結果、今後、被災箇所以外の屋根全体も修繕する必要があることが判明したため、今年度から来年度に掛けてそれら工事を実施していく予定である。 ・施設再開は、令和 3 年 4 月を予定している。 				
備 考 (答申・協議結果を得たい 時期、今後の予定など)					
担当課	スポーツ振興課	担当者	小柳 卓也	電話	457-2421

天竜 B&G 海洋センターについて


各種調査が終了したため、台風 24 号による被災後の進捗状況を報告します。

1 進捗状況

- ☞ 台風 24 号による屋根の破損(被災箇所)は復旧。
- ☞ 現在は、施設内部の梁や柱の補強工事を進めている。
- ☞ 調査の結果、今後、被災箇所以外の屋根全体も修繕する必要があることが判明したため、今年度から来年度に掛けてそれら工事を実施していく予定である。
- ☞ 施設再開は、令和 3 年 4 月を予定している。

2 これまでの経緯

- ☞ H30.9.30 … 台風 24 号により屋根の一部が破損
- ☞ H30.12.25 … 天竜区協議会に「屋根改修工事について」協議
 - ・H31.1～3 月：被災箇所復旧工事、被災箇所以外の詳細調査
 - ・H31.4 月～：施設再開(予定)、被災箇所以外の設計委託(予定)
 - ・H32.4 月：被災箇所以外の改修工事(施設休館予定)、平成 32 年度内に再開予定
- ☞ H31.2.25 … 天竜区協議会に「屋根改修工事について」協議
 - ・鉄骨等の納期が長期化しており、資材調達に時間を要することが判明したため工事期間等を変更
 - ・被災箇所の復旧工事、被災箇所以外の調査：H31.1.8～H31.3.31⇒H31.1.8～H31.5.31
 - ・施設仮再開予定：H31.4.1⇒H31.6.1
- ☞ H31.4.24 … 天竜区協議会に「屋根改修工事について」協議
 - ・内部に腐食した状況が複数確認され、施設の安全性が確保されていないことが判明
 - ・早急に屋根全体に関する調査を行った後に改修計画を決定
 - ・改修計画が不確定のため、再開の目途は未定
 - ・詳細が判明次第、随時公表
- ☞ R1.7.5～ … 天竜 B&G 海洋センター構造用集成材劣化調査
 - ・施設内部の他の梁に腐食を確認
 - ・被災箇所以外の屋根に腐食が見られ、屋根全体が剥がれる可能性あり (3-①)
- ☞ R1.8.23 … 屋根の災害復旧工事などが完了
- ☞ 台風 24 号による屋根の破損などは復旧しており、現在施設内部の梁・柱の補強工事を進めている。

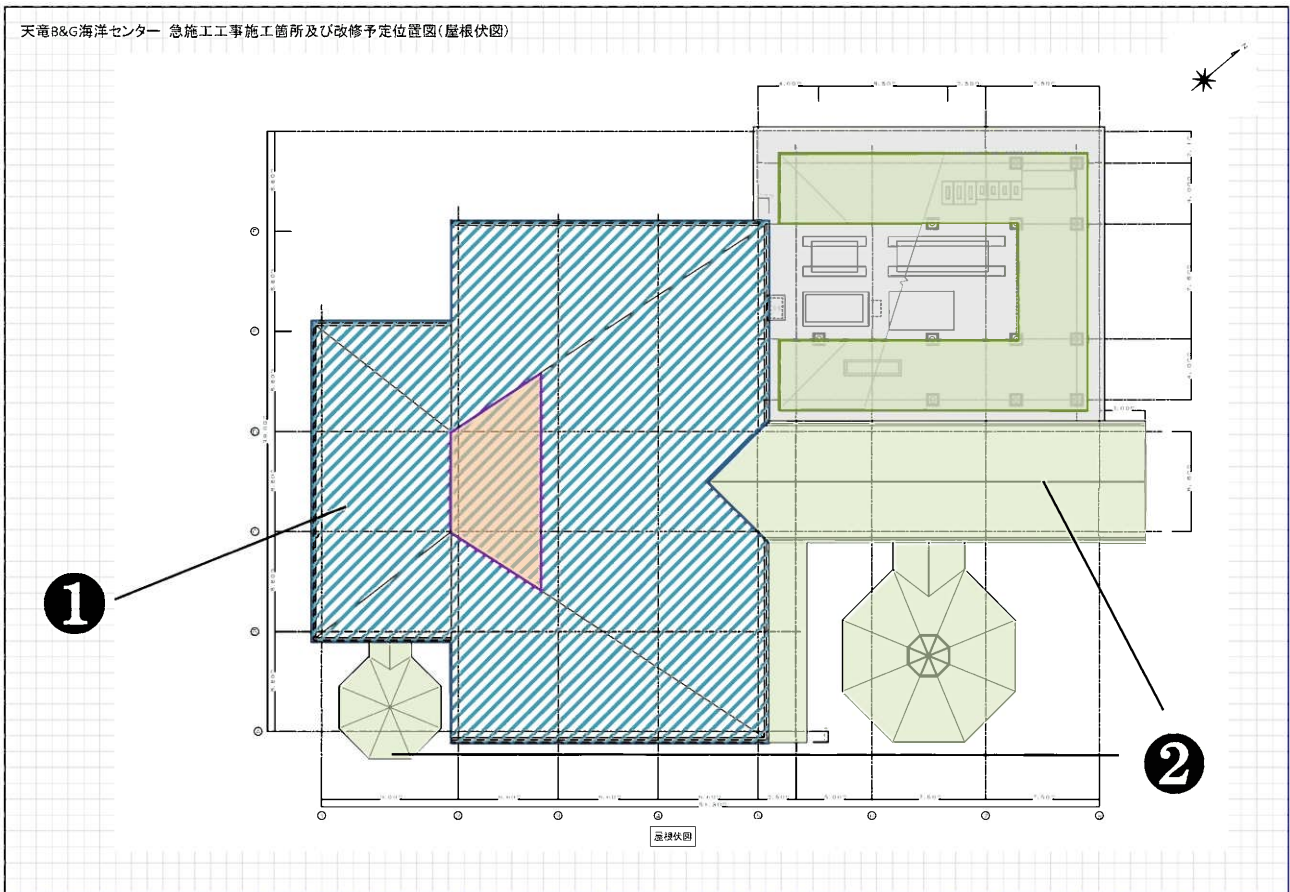

3 今後予定

- ☞ ① プール棟屋根修繕(被災箇所以外)、② 屋根改修(プール棟以外の塗装)・外壁改修[公共建築課・長寿命化]ほか
- ☞ R2.1月～R2.6月[R1.11月補正] … 実施設計
- ☞ R2.8月～R3.3月[R2当初] … 工事
